


一般国道340号 押角トンネル工事だより Vol.9



平成30年2月27日号

～工事だよりに関する問い合わせ先～
沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター
【TEL】0194-22-3111
【E-mail】BJ0010@pref.iwate.jp

○進捗状況

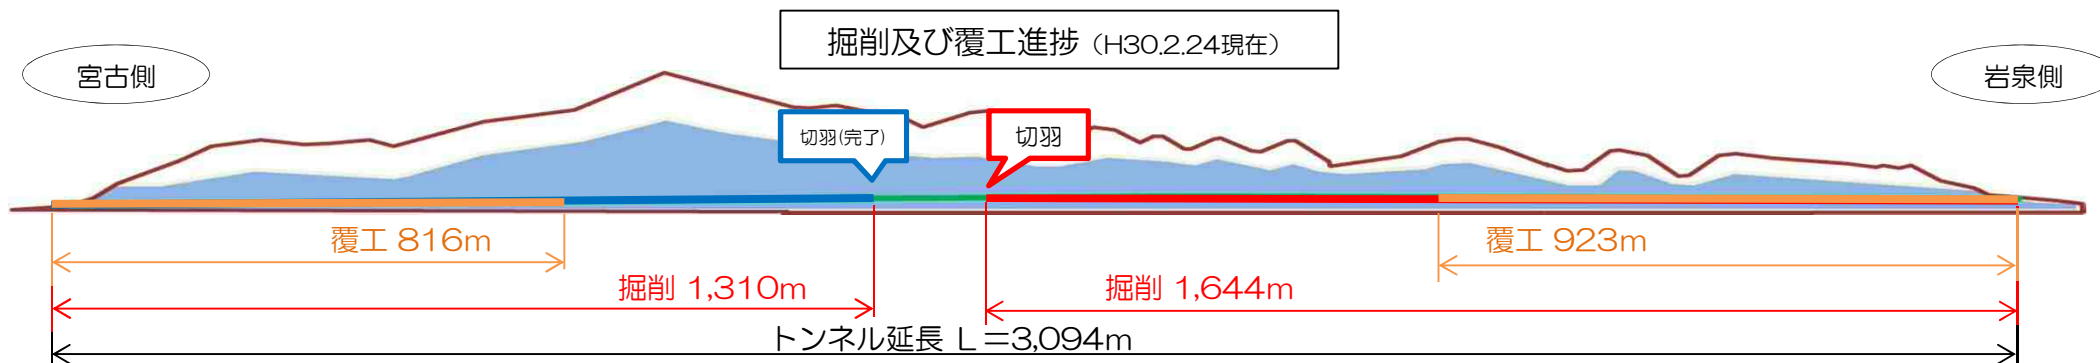

押角トンネルの掘削延長は、約2,954m（宮古側1,310m＋岩泉側1,644m）で全長の約95%の作業が完了し、残すところ約140mとなりました！
これまで、宮古側と岩泉側の両側から掘削作業を進めてきましたが、宮古側の掘削が完了し、岩泉側からのみの掘削作業を行っています。3月末にはすべての掘削作業が完了する見込みです。

覆工コンクリートは引き続き両側から施工し、約1,739m（宮古側816m＋岩泉側923m）で全長の約56%の作業が完了しています！

排水工の施工を開始しました！

宮古側のトンネル掘削作業完了に伴い、排水工の施工が始まりました！

バックホウやブレーカーで掘削した後、排水管を設置していきます。排水工によって、トンネルの湧水や路面水を坑外へ排出することができます。排出された水は貯水槽に溜められ、トンネル内で火災が発生した際などに利用されます。

