


一般国道340号 押角トンネル工事だより Vol.7



平成29年12月26日号

～工事だよりに関する問い合わせ先～
沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター
【TEL】0194-22-3116
【E-mail】BJ0010@pref.iwate.jp

○進捗状況

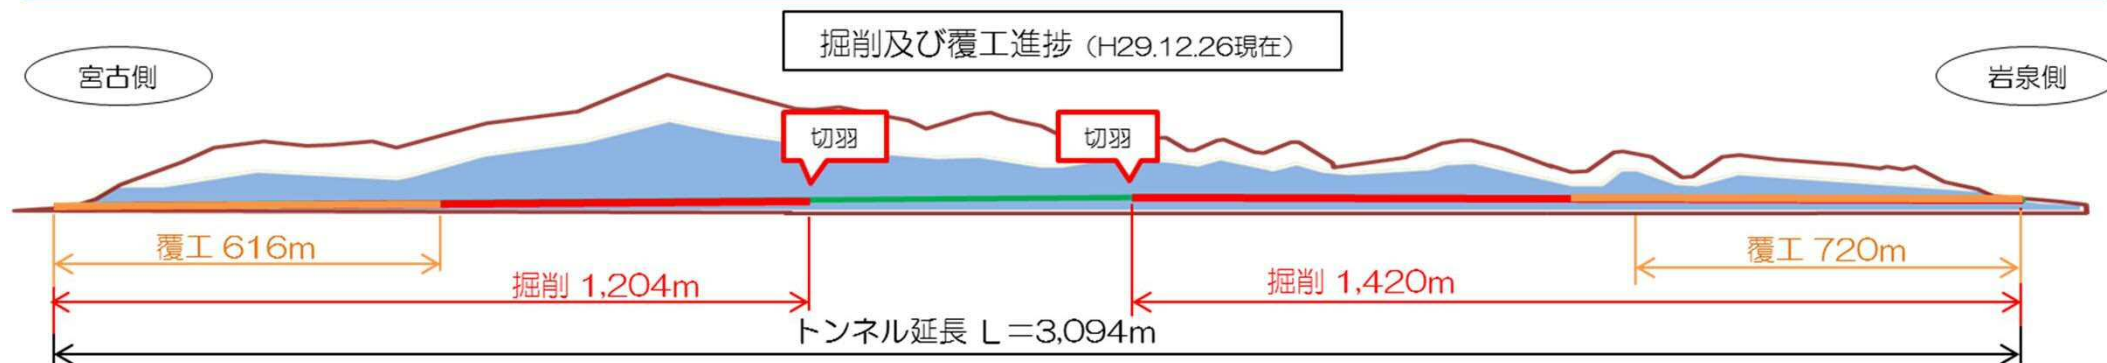

押角トンネルの掘削延長は、約2,624m（宮古側1,204m＋岩泉側1,420m）で全長の約85%の作業が完了し、残り500mを切りました！H30.3月には両側の拡幅が合流する見込みです。

覆工コンクリートは約1,336m（宮古側616m＋岩泉側720m）で全長の約43%の作業が完了しています！

トンネル掘削同様、覆工コンクリートの打設も、宮古側・岩泉側の両側から作業を行っています。1日に10.5mずつ、コンクリート量にして約85m³を両側交互に打設しています。

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
宮古側	打設	養生	打設	養生	打設
岩泉側	養生	打設	養生	打設	養生

押角トンネル Q&A

見学会などで挙げられた質問・疑問にお答えするコーナーです！

Q

覆工コンクリートにあるこの凹んだ部分（写真左）はなに？

A

箱抜（はこぬき）といって、消火栓や非常用電話などの設備や配線がこの中に収まります。そのためにコンクリートを打設する際に、あらかじめ（写真左）のような枠をあててスペースを確保しています。

