

## 平成 25 年度事業実施状況等について

平成 25 年度の廃棄物撤去の進捗状況並びに今後の予定等についてお知らせします。

### 1 廃棄物の撤去完了について

県では、平成 16 年から行政代執行による本格的な廃棄物の撤去を行ってきました。

3 月 26 日に最終運搬式を開催し、県知事をはじめとする多くの関係者に見送られ、最後の不法投棄廃棄物が処分施設へ運搬されました（図 1）。

なお、最終的な撤去量は図 3 のとおりです。

### 2 第 60 回原状回復対策協議会（3 月 15 日開催）について

3 月 15 日に開催された第 60 回原状回復対策協議会の内容についてお知らせします。

#### (1) 1,4-ジオキサン対策について

汚染源対策として、1,4-ジオキサンが高濃度で検出されている A 地区と B 地区の境界の法面の掘削除去を行う予定です（図 2）。

また、掘削除去後は、貯水池の設置や注水等により洗い出しを進めて浄化していきます。

#### (2) 汚染地下水の流出防止対策について

県境部の遮水工については、3 月 4 日から鋼矢板の設置工事を進めており、早期の工事完了を目指しています。



図 1：廃棄物を積載した車両

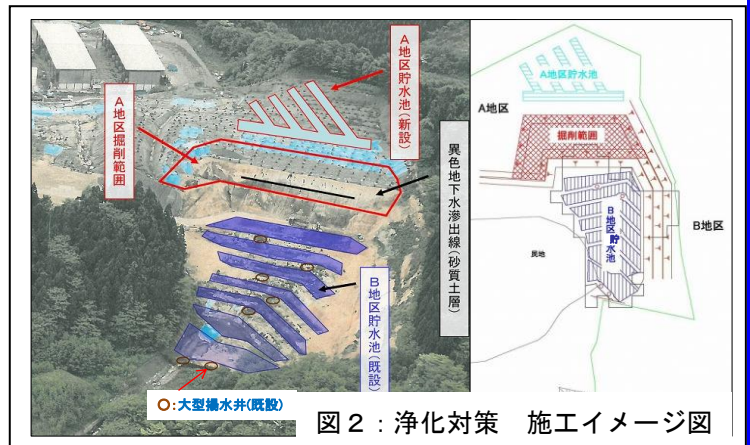


図 2：浄化対策 施工イメージ図

### 第 61 回原状回復対策協議会を次のとおり開催する予定です。

どなたでも御自由に傍聴できます。

日時 平成 26 年 5 月 17 日（土） 午後 2 時 20 分から

場所 二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室（二戸市石切所字荷渡 6-3）

### 廃棄物の撤去状況について（平成 26 年 3 月末現在）

表：平成 25 年度の月別撤去量

	撤去量(トン)
25年 5～12月	11,515
26年 1月	1,778
2月	1,702
3月	747
計	15,742

※撤去量については、小数点以下の端数処理をしているため、割合の合計が 100% にならない場合があります。

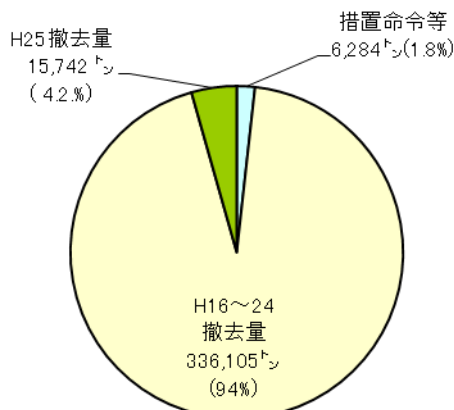


図 3：岩手県側廃棄物の撤去状況

左の図 3 に岩手県側廃棄物の撤去状況を示します。

3 月末までに、岩手県側廃棄物の撤去を完了し、最終的な撤去量は 358,131 トンです。
