

今後の社会資本の復旧・復興の概要 (その3)

平成27年 9月

岩手県

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

1 趣旨

6月末に、平成28年度以降の5か年の復興事業の一部に地方負担が導入されることとなり、今後の復興の遅れが懸念されたところです。

しかし、県・市町村等の強い働きかけにより地元負担の軽減が図られたことや、予定されている事業の国費がほぼ全額確保されることとなったことから、復興を遅らせることなく着実に事業を進めることができる目途がつかしました。

現在、被災地では復興事業が本格化し、目に見える形で工事が進んでいます。様々な工事が輻輳し、個々の事業の進捗が分かりにくいという御意見も頂戴しています。

このため、平成27年7月17日(基準日:6月30日)に公表した「社会資本の復旧・復興ロードマップ」を基に、それぞれの事業の概要や事業費、完成予定時期等を簡潔にまとめましたので、復興事業を理解していただくための資料として御活用ください。

2 今回掲載した事業

- ・ 復興道路等
- ・ 港湾
- ・ 医療
- ・ 教育

3 目次

- ・ 平成28年度以降5年間の復興事業について…………… 1ページ
- ・ 洋野町…………… 3ページ
- ・ 久慈市…………… 4ページ
- ・ 野田村…………… 5ページ
- ・ 普代村…………… 6ページ
- ・ 田野畑村…………… 7ページ
- ・ 岩泉町…………… 8ページ
- ・ 宮古市…………… 9ページ
- ・ 山田町…………… 11ページ
- ・ 大槌町…………… 12ページ
- ・ 釜石市…………… 13ページ
- ・ 大船渡市…………… 15ページ
- ・ 陸前高田市…………… 17ページ
- ・ その他…………… 19ページ

4 公表スケジュール

資料番号	掲載事業※	公表時期
その1	漁港、漁業集落防災、海岸保全施設	7月31日
その2	土地区画整理、津波復興拠点、防災集団移転、災害公営住宅	8月31日
その3	復興道路、復興支援道路、復興関連道路、まちづくり連携道路、港湾、医療、教育	9月25日 (今回)

※掲載事業は、直轄事業を除く

5 その他


- (1) 本資料については、「社会資本の復旧・復興ロードマップ」と同様、県のホームページ上で更新してまいります。
- (2) 表中の事業概要、総事業費等は**平成27年6月30日時点**のものであります。

平成 28 年度以降 5 年間の復興事業について

平成 27 年 7 月 岩手県復興局

1 復興財源フレーム

- ❖ 国において、被災 3 県が試算した復興事業費をベースに、**H28～H32 に必要となる国費(6.5 兆円)を確保。**
- ❖ これにより、**岩手県・市町村が必要と見込んでいる国費は概ね確保。**

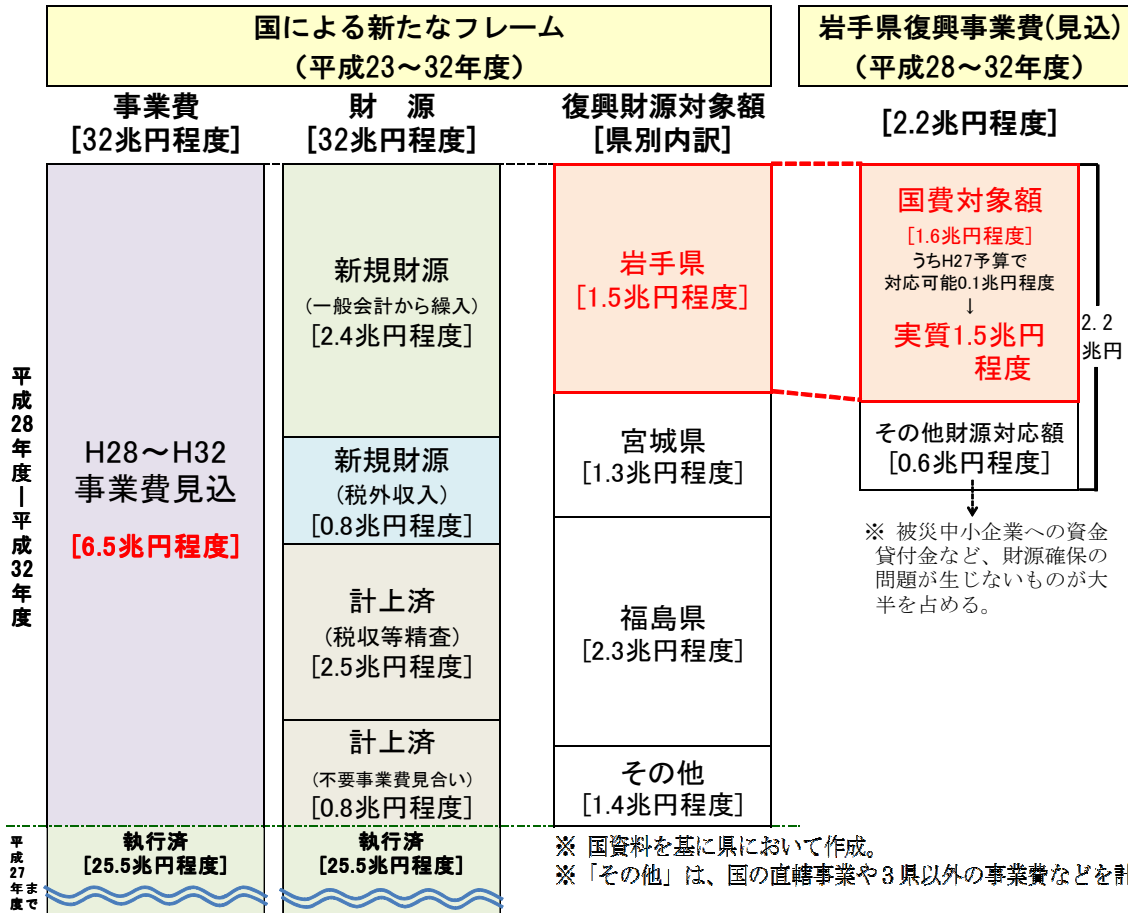

※ 今回新たに生じる地方負担額(3県で220億円程度、本県90億円程度)については、フレーム上は明記されていない。

2 国による平成 28 年度以降の復興事業の整理

- ❖ 災害復旧・インフラ整備・まちづくり・心のケアなど、**主要な復興事業は、ほぼ全てが引き続き復興特別会計で実施(必要な国費が措置)。**
- ❖ 道路事業等に一部自治体負担が導入されたが、**事業実施に必要な国費は措置されており、事業は予定どおり実施可能な見込み。**

引き続き復興特会で実施する主な事業		一般会計へ移す事業
全額国費	自治体負担あり (地方負担の5%(各事業費の1～3%))	自治体負担あり (通常事業と同一)
○被災者支援 ⇒災害救助、心のケア等 ○災害復旧 ○復興交付金(基幹事業) ○原発事故由来の事業 ○直轄事業 ⇒三陸沿岸道路 ○任期付職員・応援職員経費 ○市町村防潮堤 等	○直轄事業 ⇒宮古盛岡横断道路 東北横断自動車道秋田釜石線 久慈港湾口防波堤 等 ○復興交付金(効果促進事業) ○社総交[復興枠]道路事業など ⇒東北自動車道 <u>以西</u> の事業	○社総交[一般枠]道路事業 ⇒東北自動車道 <u>以西</u> の事業 (本県1事業のみ)

3 地方負担拡大に伴う影響

※ 国資料を基に県において試算

❖ 新たに生じる地方負担額は、現時点で**約90億円**。
(県約73億円、市町村約16億円)

[単位：億円]

事業名等	平成28年度以降 事業費			新たに生じる 地方負担額		
	国・県	市町村	合計	県	市町村	合計
道路整備事業 宮古盛岡横断道路 東北横断自動車道釜石秋田線等	1,595	11	1,606	18.8	0.2	19.0
港湾整備事業 久慈港湾口防波堤等	522	0	522	9.5	0.0	9.5
社会資本整備総合交付金 道路、防潮堤、水門等	1,242	137	1,379	29.3	3.8	33.1
水産基盤整備事業 漁港、漁港施設機能強化等	340	47	387	7.6	2.0	9.6
農山漁村地域整備交付金 防潮堤、水門等	194	25	219	4.9	0.6	5.5
復興交付金(効果促進事業) 下水道、避難路、 復興祈念公園、養浜等	129	614	743	1.3	7.7	9.0
その他 種苗放流、交通安全施設等等	82	48	130	1.5	1.6	3.1
合計	4,104	882	4,986	72.9	15.9	88.8

※ 新たな需要や状況変化により、今後、事業費及び地方負担額が変わる場合も想定されるもの。

4 地方負担拡大への対応

❖ 地方負担は拡大するが、以下の措置により、**財政への大きな影響は回避できる見込みであり、復興を遅らせることがないようしっかりと対応。**

- 国は、復興交付金の効果促進事業について、**配分済みの一括配分の自治体負担は引き続きゼロとする方針。今年度、追加配分予定（被災地全体で700億円程度）。**また、一事業当たり事業費の上限を撤廃し、配分額の上限を引き上げ。
- 国は、**被災自治体で新たに生じる負担額について、地方債の発行を認める方針。**

5 その他

❖ 平成28年度以降は一般会計等で対応とされている事業や、平成27年度で終了とされている事業については、**国に対して被災地の実情を丁寧に説明し、関係省庁への要望を行うなど、必要な予算確保に取り組む。**

(平成27年度で終了とされている主な事業に関する国の方針)

- **震災等対応雇用支援事業**
引き続き不可欠なものについては28年度以降も雇用支援とは別の形で支援を検討。
- **特定被災地域公共交通調査事業（コミュニティバス運行支援）**
被災者支援として引き続き実施する方向で検討。

県は、市町村・国と連携しながら、復興を遅らせることなく、復興に邁進する。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：洋野町

分野区分等：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(一) 角ノ浜玉川線	玉川 道路改築L=580m	320	0	H27	
		(一) 明戸八木線	小田の沢 道路改築L=500m	350	300	H30	
まちづくり連携道路		(一) 八木港線	八木 道路改築L=700m	500	178	H28	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分等：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
八木港	県	北港地区	(災害復旧) 防波堤L=162m、 -4.5m岸壁L=159m 他	274	0	H25	■H26.3完成
		南港地区	(災害復旧) 第2防波堤L=13m、 1号護岸L=57.8m	53	0	H25	■H26.3完成

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：久慈市

分野区分等：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	国道281号	案内 道路改築L=2,100m	4,000	646	H30	
復興関連道路		(一) 侍浜夏井線	本波 道路改築L=2,000m	1,550	0	H24	■H24.9.30 供用開始
		(一) 野田長内線	小袖～大尻 道路改築L=3,000m	700	322	H30	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分等：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
久慈港	県	堀込地区	(災害復旧) -4.5m岸壁L=180m、 -6.0m岸壁L=497m、 -2.0m物揚場L=105m	160	0	H25	■H26.3完成
		諏訪下地区	(災害復旧) 諏訪下防波堤L=5.0m、 外防波堤L=L=293m、 -7.5m岸壁L=281.6m、 -10.0m岸壁L=23.7m	937	0	H25	■H26.3完成
		玉の脇地区	(災害復旧) 外防波堤L=297m、 北防波堤L=152m、 内防波堤L=95m、 物揚場L=51m	545	0	H25	■H25.10完成
		半崎地区	(災害復旧) 半崎防波堤L=23m、 波除堤L=40m、 -4.0m物揚場L=69m 船揚場L=48m	310	0	H25	■H25.11完成

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市 町 村 名 : 野田村

分野区分等 : 復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(主) 野田山形線	大葛の2 道路改築L=600m	160	0	H25	■H25.7.2 供用開始
			野田 道路改築L=900m	1,000	391	H29	
まちづくり連携道路		(一) 安家玉川線	野田 道路改築L=600m	2,250	334	H29	
			下安家 道路改築L=1,400m	2,300	17	H28	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市 町 村 名 : 普代村

分野区分等 : 復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(一) 普代小屋瀬線	芦渡の2 道路改築L=400m	100	40	H29	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市 町 村 名 : 田野畑村

分野区分等 : 復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(一) 田野畑岩泉線	室場 道路改築L=2,100m	607	0	H23	■H24.3.27 供用開始
			室場の2 道路改築L=3,100m	1,450	0	H27	
			一の渡 道路改築L=1,060m	500	110	H30	
まちづくり連携道路		(主) 岩泉平井賀普代 線	明戸 道路改築L=500m	450	0	H27	
			島越 道路改築L=1,100m	1,600	508	H29	
			羅賀 道路改築L=500m	200	190	H28	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：岩泉町

分野区分等：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	(主) 久慈岩泉線	龍泉洞 道路改築L=1,100m	1,507	0	H24	■H24.8.28 供用開始
			大月峠 道路改築L=2,000m	1,200	141	H28	
		国道340号	押角峠 道路改築L=3,300m	6,500	5,360	H30 以降	宮古市の押角峠 と同一箇所

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分等：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小本港	県	小本浜地区	(港湾災害復旧) 防波堤L=871m、 岸壁L=119m、 物揚場L=105m他	1,666	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
医科診療所	町	小本診療所	診療所施設整備	134	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

分野区分：教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	町	小本小学校	(災害復旧) 移転	1,495	0	H27	
中学校		小本中学校	(災害復旧) 移転	1,768	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：宮古市(1/2)

分野区分等：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興道路	県	宮古盛岡横断道	宮古西道路 道路改築L=3,600m	13,000	4,581	H30	
復興支援道路		国道340号	小国 道路改築L=2,220m	360	0	H25	■H25.11.29 供用開始
			和井内道路 道路改築L=4,890m	4,936	208	H28	
			立丸峠 道路改築L=5,210m	8,570	2,886	H30	遠野市の立丸峠 と同一箇所
			押角峠 道路改築L=3,300m	6,500	5,360	H30 以降	岩泉町の押角峠 と同一箇所
復興関連道路		宮古市道 北部環状線	山口 道路改築L=1,842m	4,316	300	H28	
		(一) 津軽石停車場線	津軽石 道路改築L=300m	1,500	645	H30	
まちづくり連携道路		(主) 重茂半島線	白浜～堀内 道路改築L=2,400m	554	0	H26	■H27.3 供用開始
			熊の平～堀内 道路改築L=3,000m	3,900	3,207	H30	
			堀内～津軽石 道路改築L=3,000m	3,950	3,027	H30	
			里 道路改築L=2,400m	2,650	1,643	H29	
			千鷲 道路改築L=1,300m	1,150	129	H28	
			石浜 道路改築L=700m	1,420	1,193	H28	
			川代 道路改築L=600m	400	71	H28	
(一) 崎山宮古線		鎌ヶ崎 道路改築L=200m	110	0	H27		

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：宮古市(2/2)

分野区分等：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
宮古港	県	出崎地区	(災害復旧) 出崎防波堤(2)L=20m	543	0	H28	災害復旧事業は完了。 一部臨港道路を市区画 整理事業により施工中
		鎌ヶ崎地区	(災害復旧) 閉伊川 -1.5m物揚場L=295m、 -3.0m物揚場L=728m	860	845	H29	
		日立浜地区	(災害復旧) -4.5m岸壁L=240m、 -2.0m物揚場L=101m、 船揚場(1)L=228m、 船揚場(2)L=84m	600	325	H28	
		高浜地区	(災害復旧) 防波堤(北)L=250.2m、 防波堤(南)L=200m、 -2.0m物揚場(1)、 (2)L=200m他	2,573	0	H26	■H27.3完成
		藤原地区	(災害復旧) 船揚場L=50m、埠頭保安 設備L=1,250m	385	48	H28	
		神林地区	(災害復旧) 南防波堤L=112m、 防波堤L=31m、-2.0m物 揚場L=181m 他	818	0	H27	
		浄土ヶ浜地区	(災害復旧) 防波堤L=89m、 -2.0m物揚場L=44m、 さん橋L=70m	107	0	H25	■H25.7完成

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
医科診療所	市	国保田老診療所	診療所施設整備	416	268	H28	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：山田町

分野区分等：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	(一) 宮古山田線	豊間根 道路改築L=1,300m	2,000	1,312	H29	
まちづくり連携道路		(主) 重茂半島線	大沢～浜川目 道路改築L=3,000m	3,420	1,926	H29	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
病院	県	県立山田病院	織笠山田中学校 北側町有地	2,984	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分：教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	町	船越小学校	(災害復旧) 移転	1,366	0	H25	■H26.3完成

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：大槌町

分野区分等：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(主) 大槌小国線	土坂の3 道路改築L=500m	442	0	H27	
まちづくり連携道路		(一) 吉里吉里釜石線	赤浜 道路改築L=800m	800	785	H28	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分：医療

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
病院	県	県立大槌病院	寺野地区ふれあい 運動公園	4,107	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分：教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	町	大槌小学校 安渡小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	(災害復旧) 移転	10,760	4,600	H28	造成、建築、仮設、 賃貸借(仮設校舎)含む
中学校		大槌中学校	(災害復旧) 移転			H28	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：釜石市(1/2)

分野区分等：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	(一) 水海大渡線	女遊部 道路改築L=1,400m	2,084	0	H23	■H24.3完成
復興関連道路		(主) 釜石遠野線	剣 道路改築L=1,540m	1,300	0	H27	
		(一) 桜峠平田線	平田 道路改築L=3,140m	950	0	H27	
		(一) 吉浜上荒川線	下荒川 道路改築L=5,140m	700	0	H27	
下荒川の2 道路改築L=300m			330	0	H27		
まちづくり連携道路		(一) 吉里吉里釜石線	室浜 道路改築L=300m	400	154	H29	
			室浜の2 道路改築L=1,500m	2,000	274	H28	
		(一) 唐丹日頃市線	荒川 道路改築L=400m	300	84	H30	
		国道283号	松原 道路改築L=300m	305	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分等：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
釜石港	県	須賀地区	(災害復旧) 南防波堤L=266m、 -4.0m1号物揚場 L=200m、 -7.5m岸壁L=152m他	3,682	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市 町 村 名 : 釜石市(2/2)

分 野 区 分 : 教育

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 降残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	市	唐丹小学校	(災害復旧) 移転	4,806	3,462	H28	児童館、防災備蓄倉庫含む
中学校		唐丹中学校	(災害復旧) 現敷地で新築			H28	
小学校		鶉住居小学校	(災害復旧) 移転	9,526	4,039	H28	幼稚園、児童館、 防災備蓄倉庫含む
中学校		釜石東中学校	(災害復旧) 移転			H28	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：大船渡市(1/2)

分野区分等：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(一) 丸森権現堂線	下船渡 道路改築L=2,100m	3,180	2,948	H30 以降	
			小石浜 道路改築L=2,320m	2,900	97	H28	
(主) 大船渡綾里三陸 線		越喜来 道路改築L=1,000m	900	0	H27		
		赤崎 道路改築L=4,100m	4,060	2,020	H30		
まちづくり連携道路		(一) 崎浜港線	越喜来 道路改築L=700m	700	0	H27	
		(主) 大船渡 広田陸前高田線	船川原 道路改築L=2,200m	2,100	1,243	H30	
	(一) 基石海岸線	末崎～基石 道路改築L=2,700m	2,400	1,480	H30		

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分等：港湾

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
大船渡港	県	野々田地区	(災害復旧) 防波堤L=170m、 須崎防波堤L=60m、 -4.5m岸壁L=150m、 -3.0m物揚場L=87m他	1,640	0	H27	
		茶屋前地区	(災害復旧) -9.0m岸壁L=428m、 -6.0m岸壁L=105m、 -3.0m物揚場L=376m、 -4.0m物揚場L=197m他	3,729	0	H27	
		山口地区	(災害復旧) 防波堤L=64m、 さん橋(-2.0m)L=32m、 物揚場L=70m他	600	50	H28	
		永浜地区	(災害復旧) 防波堤L=192m、 -2.0m物揚場L=108m、 -2.0m2号物揚場138m	189	75	H28	
		清水地区	(災害復旧) 防波堤L=109m、 物揚場L=285m、 船揚場L=98m	304	46	H28	
		赤土倉地区	(災害復旧) 南防波堤L=79m、 北防波堤L=165m、 -2.0m2号物揚場L=104m 他	408	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市 町 村 名 : 大船渡市(2/2)

分 野 区 分 : 教育

細分項目	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
小学校	市	赤崎小学校	(災害復旧) 移転	3,800	780	H28	
		越喜来小学校	(災害復旧) 移転	4,200	770	H28	
中学校		赤崎中学校	(災害復旧) 移転	4,300	880	H28	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：陸前高田市(1/2)

分野区分等：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興関連道路	県	(主) 大船渡 広田陸前高田線	大陽 道路改築L=1,540m	1,000	87	H29	
		(一) 長部漁港線	長部 道路改築L=260m	233	0	H24	■H24.8.24 供用開始
国道340号		(仮)今泉大橋・大石沖 道路改築L=2,600m	3,600	2,406	H30		
		竹駒 道路改築L=1,600m	800	0	H27		
まちづくり連携道路		(主) 大船渡 広田陸前高田線	小友 道路改築L=1,400m	2,500	1,261	H28	
			広田町 道路改築L=1,400m	950	0	H27	
		久保～泊 道路改築L=2,500m	2,975	793	H29		
		花貝 道路改築L=1,100m	1,200	0	H27		
	(一) 長部漁港線	長部 道路改築L=700m	250	0	H27		

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

分野区分：医療

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
病院	県	県立高田病院	氷上山麓地区	4,278	4,278	H28	
医科診療所	市	国保 広田診療所	診療所施設整備	未定	未定	H28	設計中のため 総事業費未定

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市 町 村 名 : 陸前高田市(2/2)

分 野 区 分 : 教育

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
高等学校	県	高田高等学校	(災害復旧) 校舎、第一体育館、 第二体育館、柔剣道 場、防災対応施設	3,167	0	H26	■H27.3完成 グラウンドの本整備等 は別途実施予定
小学校	市	気仙小学校	(災害復旧) 移転	未定	未定	H30	設計中のため 総事業費未定
中学校		高田東中学校	(災害復旧) 移転	4,008	100	H28	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：その他(1/2)

分野区分等：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興道路	県	宮古盛岡横断道	盛岡市 築川道路 道路改築L=6,700m	14,889	0	H24	■H25.3.10供用開始
復興支援道路		国道106号	盛岡市 川目 道路改築L=350m	190	0	H24	■H25.3.10供用開始
		国道107号	奥州市 札押道路 道路改築L=1,630m	911	0	H23	■H23.10.26供用開始
			奥州市 梁川～口内 道路改築L=2,690m	4,550	4,324	H30	
		国道281号	岩手町 大坊 道路改築L=1,800m	1,002	109	H28	
			岩手町 大坊の2 道路改築L=1,820m	1,200	594	H28	
		国道283号	遠野市 上郷道路 道路改築L=6,670m	6,830	0	H27	
		国道284号	一関市 真滝BP 道路改築L=1,800m	1,968	0	H24	■H24.8.7供用開始
			一関市 室根BP 道路改築L=4,880m	4,800	1,629	H28	
			一関市 石法華 道路改築L=1,300m	1,000	828	H30	
		国道340号	遠野市 土淵BP 道路改築L=4,500m	1,461	0	H25	■H25.12.25供用開始
			遠野市(宮古市) 立丸峠 道路改築L=5,210m	8,570	2,886	H30	宮古市 立丸峠と同一箇所
			九戸村 泥ノ木 道路改築L=1,010m	633	0	H26	■H27.1.16供用開始
			軽米町 駒坂 道路改築L=470m	500	19	H28	
			住田町 山谷 道路改築L=2,700m	2,400	1,129	H30	
			葛巻町 四日市 道路改築L=320m	452	0	H27	
			九戸村 長興寺 道路改築L=330m	460	147	H30	
			住田町 葉山～恵蘇 道路改築L=1,450m	1,600	1,530	H30 以降	
		国道342号	一関市 花泉BP 道路改築L=4,860m	2,881	0	H26	■H26.8.30供用開始
			一関市 白崖 道路改築L=2,440m	1,300	972	H30	
		国道343号	一関市 大原 道路改築L=2,260m	1,900	0	H25	■H26.3.28供用開始
			一関市 一ノ通 道路改築L=840m	370	0	H27	
			一関市 洪民 道路改築L=5,500m	3,300	3,135	H30 以降	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その3)

市町村名：その他(2/2)

分野区分等：復興道路等

細分項目等	事業主体	路線名	箇所名 事業概要等	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
復興支援道路	県	国道395号	軽米町 赤石峠 道路改築L=710m	450	340	H30	
		国道396号	遠野市 上宮守 道路改築L=1,250m	660	600	H30 以降	
		国道397号	住田町 子飼沢 道路改築L=2,050m	667	0	H25	■H25.9.30供用開始
			奥州市 分限城～赤金 道路改築L=15,120m	10,200	0	H27	
			住田町 高屋敷 道路改築L=3,000m	3,400	371	H29	
			住田町 津付道路 道路改築L=2,700m	3,891	0	H26	■H26.10.26供用開
			奥州市 小谷木橋 道路改築L=1,420m	8,460	6,732	H30 以降	
		(一) 遠野住田線	遠野市 新里 道路改築L=650m	2,600	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。
