

廃棄物撤去処理及び汚染土壌対策について

1) 廃棄物の撤去処分状況について

廃棄物の運搬・処分状況については、12 月末現在で 16,173 t (進捗率 77.0%) となっております。

ドラム缶等の撤去を進めている F 地区から、9 月以降 200ℓドラム缶 70 本、18ℓ缶(一斗缶)64 本を撤去しました。また、K 地区から 200ℓドラム缶 2 本を撤去しました。ドラム缶等の内容物は、有害性のない黒色液体又は暗緑色のゲル状物等でした。

撤去したドラム缶等は、本年度内に焼却処分する予定です。



F 地区ドラム缶撤去状況(10/14)

2) 汚染土壌対策について

土壌汚染が確認されている 8 地区については、汚染濃度の低下や汚染区画数の減少などが認められ、特に、B、D、F、J 及び K 地区の不飽和帯については、今年度中に浄化完了できる見込みです。

		浄化開始前 汚染区画数	H23.10末時点 汚染区画数	進捗状況
B 地区 82 区画	不飽和帯	20	0	浄化完了
	飽和帯	74	74	揚水処理準備中
D 地区 50 区画	不飽和帯	38	38	浄化進捗 25%
	飽和帯	47	47	不飽和帯対策後着手予定
F 地区 6 区画	不飽和帯	6	6	廃棄物撤去を終了し、汚染状況確認中
	飽和帯	0	0	
G 地区 21 区画	不飽和帯	13	13	来年度着手予定(土壌置場確保の関係) 11 月中に VOC モニタリング実施
	飽和帯	20	20	
J 地区 10 区画	不飽和帯	4	0	浄化完了
	飽和帯	10	3	浄化進捗 70%
K 地区 26 区画	不飽和帯	2	2	廃棄物撤去を終了し、汚染状況確認中
	飽和帯	23	23	
O 地区 25 区画	不飽和帯	5	5	廃棄物撤去後に来年度対策予定
	飽和帯	25	13	
N 地区 87 区画	不飽和帯	87	0	浄化完了
	飽和帯	87	9	浄化進捗 90%

第 50 回原状回復対策協議会を次のとおり開催する予定です。

どなたでもご自由に傍聴できます。

日時 平成 24 年 3 月 17 日 (土) 午後 2 時 10 分 (予定)


場所 二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室 (二戸市石切所字荷渡 6-3)

廃棄物の撤去状況について (平成 23 年 12 月末現在)

表: 23 年度の月別撤去量

	撤去量(トン)
23 年 4~6 月	0
23 年 7~9 月	6,676
23 年 10 月	3,545
23 年 11 月	3,678
23 年 12 月	2,274
合計	16,173

平成 23 年度撤去目標 21,000 トン

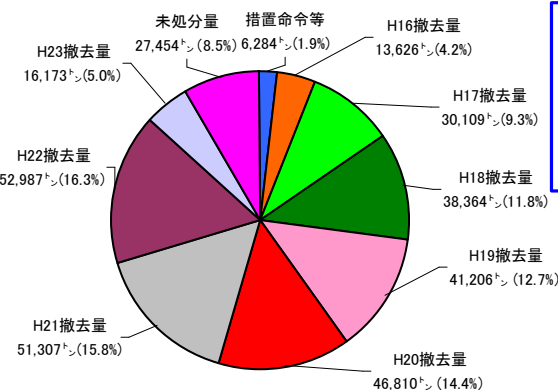

12 月末までに、岩手県側廃棄物推定総量 324,320 トンのうち、296,866 トン (91.5%) を撤去しました。

※撤去量については、小数点以下の端数処理をしているため、合計が合わない場合があります。
