林野火災対策砂防だより

Vol.9　令和8年11月作成

11月号Vol.8では、「石浜の沢（4）」についてお伝えしましたが、今回は特大号として、Vol.9「双元川既設堰堤改修工事の概要」についても併せてご紹介します。

双元川既設堰堤をどのように改修する？！

○ Vol.9では現在工事が進められている「双元川堰堤」でどのような工事が行われいるか、どこまで進んでいるのか、いつ完成予定なのかについてお知らせします。

⑤　双元川堰堤

工事の概要は

工　事　名：双元川筋坂本地区砂防堰堤改修工事
施　工　者：株式会社佐賀組
工事の期間：令和8年3月27日～令和9年3月12日
工事の費用：192百万円
作業の内容：掘削＝2,400m3（学校プール約7杯分）
　　コンクリート＝1,500m3（学校プール約4杯分）

工事実施マップ（坂本地区）



現場施工者からの声

佐賀組　現場責任者
千葉　泰宏　さん

双元川筋坂本地区砂防堰堤改修工事を担当しております、株式会社佐賀組の 千葉と申します。

日頃より地域の皆様には、工事への温かいご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

本工事は既設堰堤の腹付け補強や鋼製流木捕捉工の設置を行い、土砂災害や流木被害から地域の安全・安心を守る重要な災害関連事業です。

現場ではこれまでに伐採・伐根搬出、既設構造物のワイヤーソーイング、水替え仮水路（波状管）設置工事が無事に終了いたしました。

いよいよこれより、土砂災害防止の要となる堰堤掘削をはじめとする本体工事へ本格的に着手いたします。

今後も周辺環境への配慮と安全管理を最優先に、無事故・無災害で高品質な施工に努めてまいります。



現在の工事進捗はこんな感じです。

進捗レベル

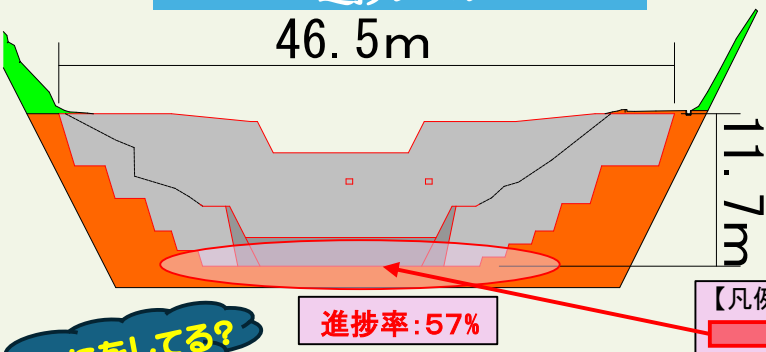

進捗状況写真



なにをしてる？

○ これまでに、川の流れの切り替えが完了しました。

○ 現在、堰堤の基礎となる部分の岩盤を掘削するとともに、堰堤上流側にたまった土砂を撤去しています。

進捗メータ	事前準備	伐採	支障木搬出	施工ヤード整備		本体補強			流路築造			土砂撤去		現道復旧		後片付け	完成
双元川堰堤	■	■	■	■	■							■					

～おたよりに関するお問い合わせ先～
沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター
林野火災対策砂防チーム
【電話】0192-27-9934
【E-mail】BG0005@pref.iwate.jp

携帯・スマートフォンからはこちら

【次　回】
「現場で働く重機たち」
をお送りいたします。
